

文京区立柳町小学校の教室対策について

1 概要

Ⅱ期工事（新校舎北棟建設工事）エリアについては、埋蔵文化財試掘調査の結果、江戸時代の遺物等が発掘され、現在、令和6年5月までの予定で埋蔵文化財本調査を行っている。このことによる改築工事の工期変更と、学区域内の児童数の増加及び令和3年4月1日施行の義務教育標準法の改正への対応から、令和7年4月には改築工事開始時の予測を上回る教室数が必要となったため、新たな仮設校舎を建設し、Ⅱ期工事完了までの普通教室等の不足に対応する。

<仮設校舎概要>

鉄骨造地上2階 約950㎡（予定）

普通教室8室、多目的室2室、廊下、トイレ（バリアフリースイール含む。）等

2 スケジュール（予定）

実 施 設 計 令和6年1月～令和6年9月

建 設 工 事 令和6年10月～令和7年3月


供 用 開 始 令和7年4月

3 現況図及び第二仮設校舎平面図（案）

別紙1・2のとおり


4 その他

埋蔵文化財本調査に約7か月を要し、その後に地盤改良工事等が必要となることから、令和7年7月予定だったⅡ期工事（新校舎北棟建設工事）の完了は令和8年7月に、令和8年11月予定だった完全しゅん工は令和9年11月に予定を変更する。

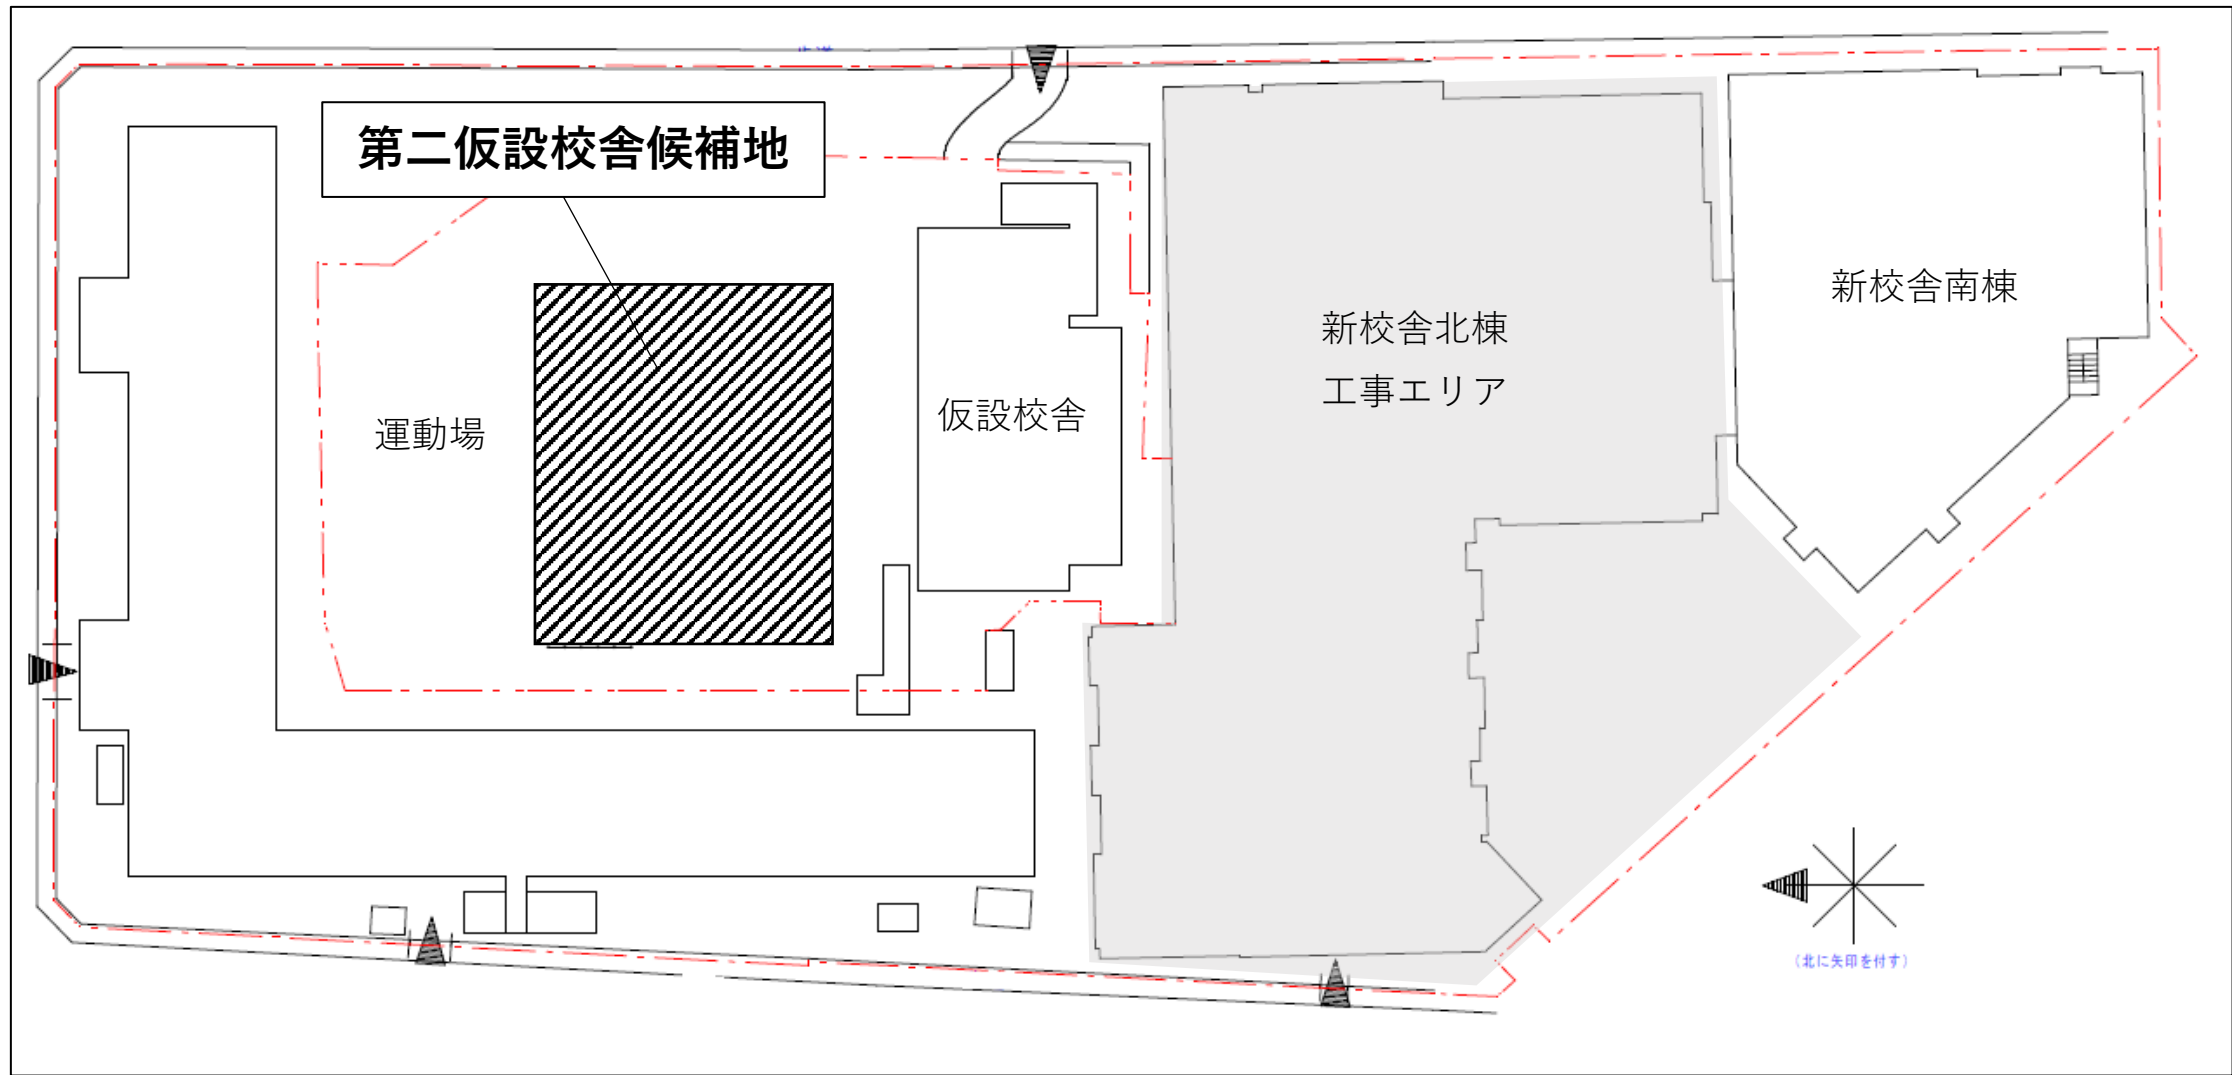


第二仮設校舎平面図（案）

【別紙2】

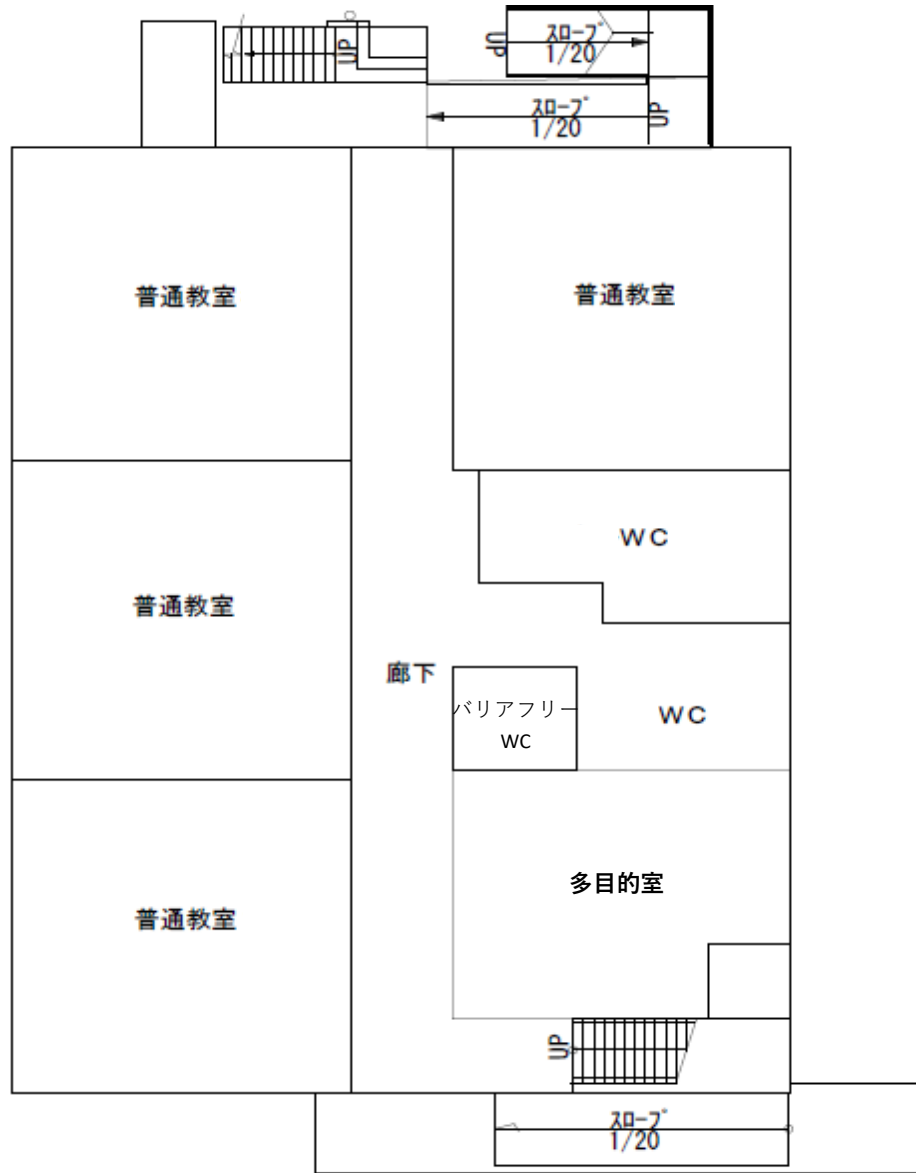

1階平面図

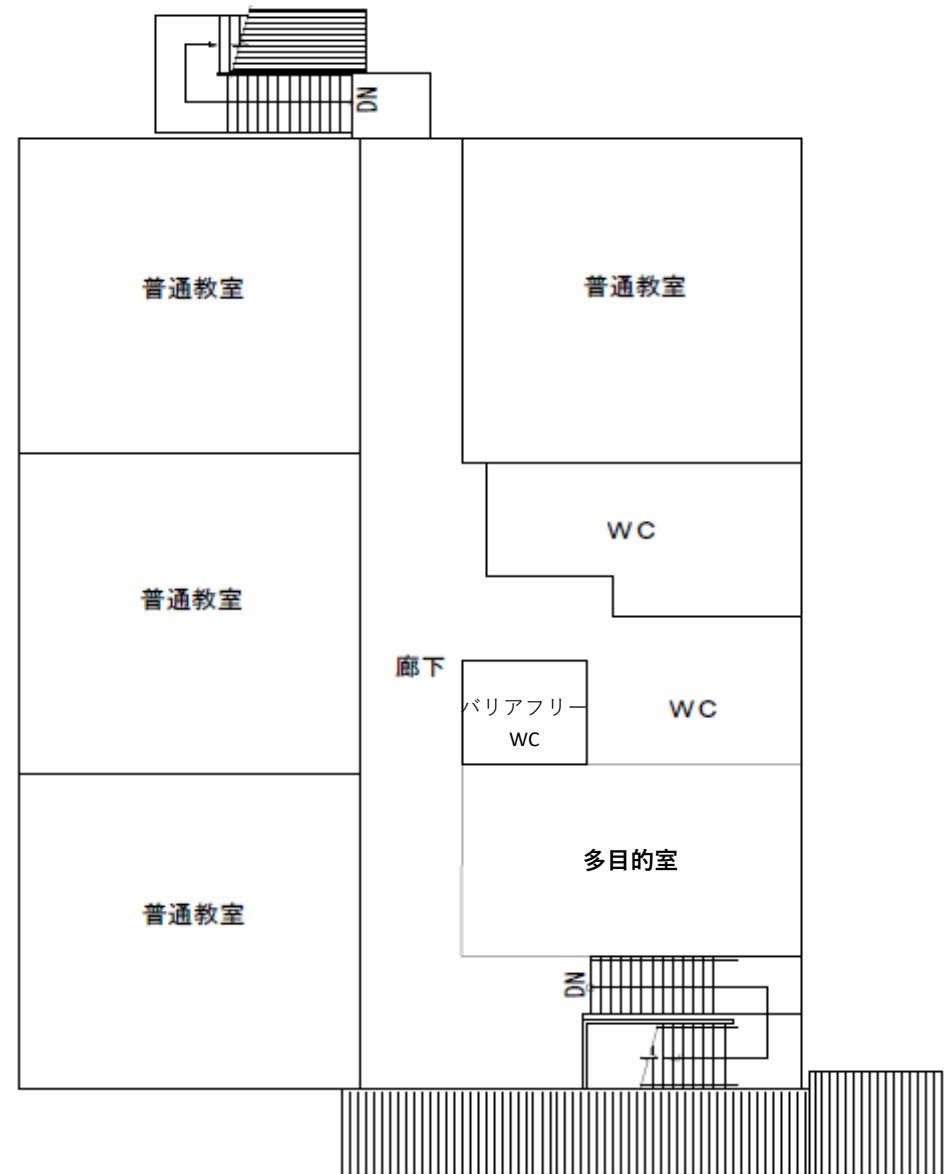

2階平面図

(参考) 児童数及び学級数の推計

| | 令和5年度推計 | | | | | | | 令和5年度推計 | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------|----|----|----|----|----|-----------|
| | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 令和5年度 | 105 | 75 | 93 | 74 | 68 | 74 | 489 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 令和6年度 | 90 | 107 | 76 | 94 | 75 | 69 | 511 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 令和7年度 | 94 | 90 | 107 | 76 | 94 | 75 | 536 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 令和8年度 | 115 | 104 | 100 | 117 | 86 | 104 | 626 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 令和9年度 | 110 | 115 | 104 | 100 | 117 | 86 | 632 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 令和10年度 | 103 | 110 | 115 | 104 | 100 | 117 | 649 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 |
